

# Oltenia se dezvoltă prin POR 2021-2027

**Analiza implementării POR 2014-2020,  
lecțiile învățate din exercițiile anterioare de programare  
problemele întâmpinate în implementarea proiectelor  
soluțiile identificate pentru rezolvarea acestor probleme**

**CIFRELE  
ACTUALE  
POR 2014-2020  
REGIUNEA  
SUD-VEST  
OLTENIA**



**Aprox 1876** proiecte depuse în Regiunea Sud-Vest



**922** proiecte contractate, cu o valoare finanțabilă totală de aprox **1,7 miliarde EUR**




**426 milioane EUR** valoare totală nerambursabilă plătită până în prezent

# POR 2007-2013

## VS

# POR 2014-2020

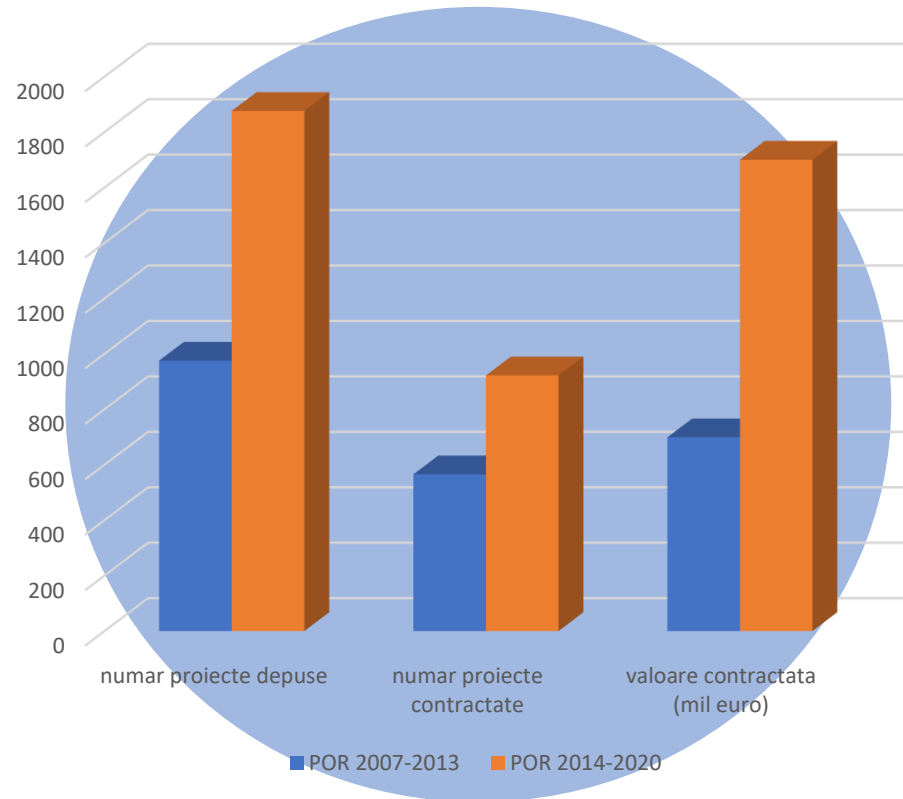

## Experiența acumulată +

---

- **Pregătirea portofoliilor** de proiecte în acord cu instrumentele disponibile de planificare: strategii locale/județene integrate în planurile regionale/naționale;
- **Activitatea de prioritizare a proiectelor** la nivel regional pentru anumite axe/priorități;
- **Interesul crescut al APL** din regiune pentru **accesarea programului**, având în vedere proiectele de succes implementate anterior (2007-2013) și promovate la nivel regional și național prin campaniile REGIO

## **Experiența acumulată +**

- **Proceduri de lucru îmbunătățite** pe parcursul a 2 exerciții de programare aplicate deja în perioada 2014-2020 și care și-au dovedit eficiența determinând atât scurtarea duratelor de procesare a documentelor, dar și creșterea randamentului în activitățile de verificare/monitorizare în care au fost implementate;
- **Măsurile de simplificare** aplicate nu au avut influențe negative asupra “sistemului” (nu au fost semnalate erori/abateri imputabile măsurilor de simplificare);

# Experiența acumulată – Lecții învățate

---

**TIMPUL** – cel mai mare inamic al proiectelor REGIO

1. Durata mare de timp scursă de la depunerea unei cereri de finanțare până la semnarea contractului și demararea efectivă a implementării;

**Etapă de evaluare și contractare a proiectelor** a fost un **proces cronofag** care nu a mai putut beneficia în timp util de optimizări și simplificări, fiind vorba despre o decizie care viza apeluri de proiecte deja lansate pentru care nu se puteau schimba regulile în timpul jocului.

# Experiența acumulată - Lecții învățate

---

**TIMPUL** cel mai mare inamic al proiectelor REGIO

**2.Prelungirea contractului** de finanțare s-a dovedit a fi **o regulă**, nu o excepție!

Fiecare contract de finanțare a beneficiat de mai multe prelungiri ale duratei de implementare, motivele fiind obiective și/sau neprevăzute

(în top: necesitatea reluării procedurilor de achiziție

și necesitatea actualizării DALI/PT)

# Experiența acumulată - Lecții învățate

---

**3.TIME IS MONEY** .... A funcționat, dar nu în folosul beneficiarilor!

- Prelungirea duratei de implementare a determinat necesitatea actualizării (**creșterii valorii) devizului general;**
- Prelungirea duratei de implementare a determinat **costuri suplimentare** (ex: actualizarea documentațiilor tehnico-economice a condus la plata unor servicii suplimentare)



# Experiența acumulată - Lecții învățate

---

**4.Contractele de Proiectare cu Execuție** sau .... *marile speranțe* ale POR 2014-2020,

**Acest tip de contract** a dovedit în timp că **are propriile limitări** cauzate de lipsa unui istoric de colaborare între proiectant și constructor: întârzieri și dispute financiare; **estimarea nerealistă a termenelor** de prestare a activităților; **omisiuni frecvente în proiecte**

Din experiența acumulată apreciem că acest tip de contract **se pretează mai**  
**pentru investiții mari** (peste 1 Meuro)

# Ce ne propunem în POR 2021-2027

---

I. Pentru **potențialii beneficiari** de finanțare:

- diversificarea activităților de Helpdesk** dedicat autorităților publice locale interesate să dezvolte proiecte;
- diseminarea bunelor practici în domeniul achizițiilor publice** în scopul creșterii calității documentațiilor de atribuire, scurtării perioadelor de atribuire a contractelor și evitarea corecțiilor financiare;

II. **Intensificarea Instruirilor tematice pentru beneficiari**

# Ce ne propunem în POR 2021-2027

---

- **Simplificarea** procesului de evaluare/contractare a cererilor de finanțare, optimizarea grilelor utilizate și **reducerea semnificativă a perioadei** scurse de la depunerea unei aplicații până la **semnarea contractului de finanțare;**
- **Contractarea proiectelor** la stadiul DTAC/Autorizație de construire **va reduce cu peste 15 luni durata** de implementare a fiecărui proiect și contractarea la un nivel realist al valorii

# Ce ne propunem în POR 2021-2027

---

## Efectuarea plăților la nivel regional

- va permite urmărirea mult mai facilă a **atingerii țintelor de absorbție**;
- va contribui la **accelerarea implementării** proiectelor;
- va permite **simplificare**, inclusiv prin adoptarea unor **soluții inovative** puse **la dispoziția beneficiarilor** pentru redactarea și transmiterea cererilor de rambursare/plată/prefinanțare, și a rapoarte de progres

Prioritatea de investiții 10.1 -  
Investițiile în Educație/ Operațiunea A-  
Cresterea gradului de participare la nivelul  
educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu

**124682 -Construire gradiniță**

**Beneficiar: Comuna Șimian/Mh**

**Grant: 816.090 euro**

**Construcție nouă:**

**6 Săli de clasă + anexe**

**Beneficiari direcți 115 copii**

**+ familiile acestora**



**PI: 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile**

**124682- Creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale**

**Beneficiar: Comuna Bratovoiești/DJ**

**Grant: 225.929 euro**

**Izolarea elementelor constructive, refacerea instalațiilor termice, sanitare, electrice inclusiv panouri fotovoltaice**

**Beneficiari direcți 200 copii + familiile acestora**





**PI: 4.4 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții**  
**123202-Extindere și reabilitare Grădinița**

**"Mihai Eminescu", Corp C1**

**Beneficiar: Municipiul Târgu Jiu/ GJ**

**Grant: 890.395 euro**

**Anvelopare corp existent și refacere instalații electrice și termice și extindere în vederea asigurării serviciilor de preparare hrană, servicii medicale, sală polifuncțională**

**Beneficiari direcți 421 copii**

**+ familiile acestora**



---

**PI: 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile**

**117319- Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe S15, S16, 95, H, 13**

**Beneficiar: Municipiul Râmnicu Vâlcea/VL**

**Grant: 1.399.066 euro**

**Izolare termică exterioară, înlocuire tâmplărie, izolare termică planșeu peste subsol, înlocuire conducte distribuție și contorizare termoficare**

**Reducerea consumului specific de încălzire cu peste 50%**

**Beneficiari direcți: locuitorii din 225 apartamente**

---





PI:5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

116327-Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Izvoranu - Geblescu

Beneficiar: Parteneriat UAT Dolj și Comuna Brabova

Grant: 432.214 euro

Consolidare structură, restaurare elemente originale de arhitectură, metal, lemn, instalații electrice, termice, detectoare incendii

Amenajare muzeală modernă, interactivă cu dioramă tematică, ghid audio, plan tactil Braille

Beneficiari direcți: peste 100.000 elevi din

Județ dar și turiști din regiune și zona transfrontalieră (Bg)



Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020

## PI: 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a

gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile

**114684-Creșterea eficienței energetice a**

**corpului principal al**

**Școlii Gimnaziale Mihail Drumeș**

**Beneficiar: UAT Oraș Balș, județul Olt**

**Grant: 314.558 euro**

**Suprafața utilă 1000 mp**

**Lucrări de rehabilitare termică a anvelopei, a sistemului de încălzire/apă caldă,**

**desființare sobe, iluminat, surse alternative**

**energie: centrală biomasă**

**Beneficiari direcți: aprox. 400 elevi**





PI: 10.1 Investiții în educație și formare,  
inclusiv în formare profesională

124758- Modernizare corp A și demolare și  
construire corp B grădiniță

Beneficiar: comuna Dobrun, județul Olt

Grant: 163.433 euro

Modernizare și extindere pentru asigurarea  
unor funcțiuni diverse: sală multimedia, sală  
activități educaționale, sală de mese, spații  
administrative

Beneficiari direcți: aprox. 25 preșcolari și  
familiile acestora



**PI: 8.1 Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială**

**124758- Echipare și dotare Ambulatoriu Spital Municipal Orșova**

**Beneficiar: Municipiul Orșova/ MH**

**Grant: 971.520 euro**

Dotarea cu echipament medical (computer tomograf și alte echipamente specifice) pentru specialități diverse: cardiologie, ORL, recuperare fizică și balneologie, ortopedie, neurologie, medicină internă, etc.

**Beneficiari direcți: peste 8000 pacienți anual**



Proiect: Echipare și dotare Ambulatoriu Spital Municipal Orșova  
Beneficiar: UAT Municipiul Orșova, județul Mehedinți



Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020

PI: 8.1 Investiții în infrastructurile sanitare și sociale

OS 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

**116705- Înființare centru social de zi și unitate de îngrijire la domiciliu în sat Cornești**

**Beneficiar: Parteneriat Comuna Bălești și Asociația Sf. Toma/ GJ**

**Grant: 257.096 euro**

Reabilitare (inclusiv consolidare), extindere construcție existentă Sd=260 mp; 5 locuri de parcare; 1100 mp spații verzi, dotări mobilier specific și echipamente

**Beneficiari direcți: 250 persoane vârstnice (dintre care 50 îngrijite la domiciliu)**





PI: 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile

**118167- Consolidarea și reabilitarea energetică a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca**

**Beneficiar: UAT Județul Vâlcea/ DGSAP VL**

**Grant:736.298 euro**

**Termo și hidroizolații anvelopă; refacere instalație termică/ACM, instalare baterie panouri fotovoltaice;**

**Principalul beneficiu reducerea consumului anual de energie primară cu cca 60%**

**Beneficiari direcți: 48 de persoane cu**

**probleme neuropsihiatrice**



# Vă mulțumim!

---



Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova  
[www.adroltenia.ro](http://www.adroltenia.ro)  
0251/411.869; [office@adroltenia.ro](mailto:office@adroltenia.ro)
